



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

12 November 2007

1

TARGET2


## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

- Γενικά
- Δοκιμές διασύνδεσης-  
λειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιμές
- Δοκιμές με την ΤτΕ
- Δοκιμές Χώρας
- Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας
- Δοκιμές T1/T2

12 November 2007

2

## Χρονοδιάγραμμα δοκιμών της Ελλάδας

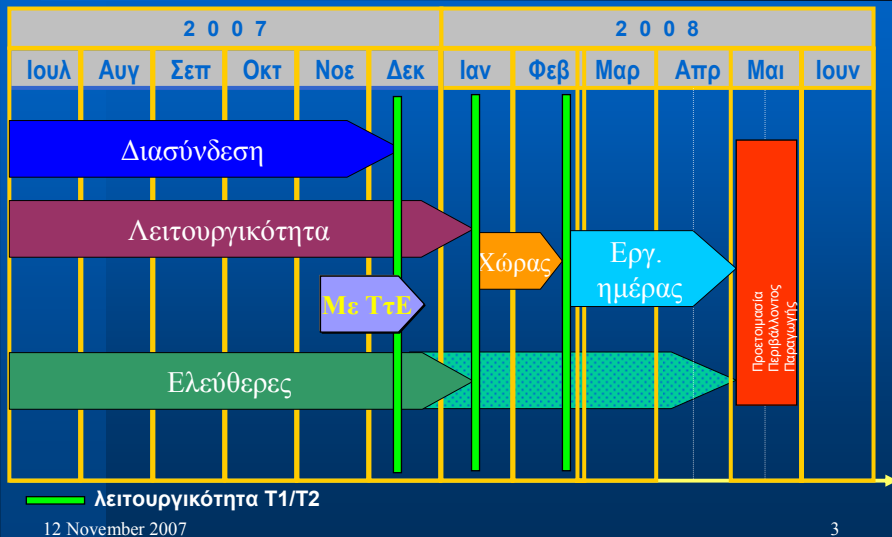

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

- Γενικά
- Συμμετοχή όλων των Π.Ι.
- Δοκιμές όλων των επιχειρησιακών περιπτώσεων

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

**Δοκιμές διασύνδεσης-  
λειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιμές**

- Χρονοδιάγραμμα δοκιμών
- Τρέχουσα κατάσταση
- Απαιτήσεις της ΤΤΕ

12 November 2007

5

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

**Δοκιμές διασύνδεσης-  
λειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιμές**

**Χρονοδιάγραμμα δοκιμών**

**Διασύνδεσης: από 2/7-14/12/2007**

**Λειτουργικότητας: από 2/7/2007-16/1/2008**

**Ελεύθερες δοκιμές: από 2/7/2007-2/5/2008**

12 November 2007

6

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές διασύνδεσης-λειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιμές

#### Τρέχουσα κατάσταση

Διασύνδεσης: ποσοστό ολοκλήρωσης 80%

Λειτουργικότητας: ποσοστό ολοκλήρωσης 40%

Ελεύθερες δοκιμές: Όλα σχεδόν τα Π.Ι. που έχουν ολοκληρώσει τις δοκιμές διασύνδεσης έχουν ξεκινήσει τις δοκιμές αυτές

12 November 2007

7

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές διασύνδεσης-λειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιμές

#### Απαιτήσεις της ΤΤΕ

- Ολοκλήρωση των δοκιμών διασύνδεσης: 30/11/2007
- Ολοκλήρωση των δοκιμών λειτουργικότητας με πιστοποίηση: 21/12/2007

12 November 2007

8

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές με την ΤτΕ

- Σκοπός δοκιμών
- Προϋπόθεση διεξαγωγής
- Χρονοδιάγραμμα δοκιμών
- Περιεχόμενο δοκιμών

12 November 2007

9

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές με την ΤτΕ

#### Προαιρετικές δοκιμές για τα άμεσα μέλη

#### Σκοπός δοκιμών

Προετοιμασία των Π.Ι. και της ΤτΕ για:

- Διαπίστωση βαθμού ετοιμότητας εφαρμογών-διαδικασιών
- Επιτυχής διεξαγωγή Δοκιμών Χώρας/Εργάσιμης Ημέρας
- Ομαλή μετάπτωση στο TARGET2

12 November 2007

10

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές με την ΤΤΕ

### Απαραίτητη Προϋπόθεση:

Επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών  
διασύνδεσης

Επιθυμητή η έναρξη/ολοκλήρωση των  
δοκιμών λειτουργικότητας

12 November 2007

11

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές με την ΤΤΕ

### Χρονοδιάγραμμα δοκιμών

- 22 Νοεμβρίου ως 14 Δεκεμβρίου  
2007
- Ωράριο δοκιμών: καθημερινά 10:00-  
14:00

12 November 2007

12

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές με την ΤΤΕ

### Περιεχόμενο δοκιμών

Εντολές πληρωμής MT202/103 από/προς:

- ΤΤΕ
- Άμεσα μέλη (εγχώριες & διασυνοριακές)
- Έμμεσα μέλη (μέσω ΤΤΕ)
- Έμμεσα μέλη (μέσω άλλων Π.Ι. -εγχώριες & διασυνοριακές)

12 November 2007

13

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές Χώρας

- Σκοπός δοκιμών
- Προϋπόθεση διεξαγωγής
- Χρονοδιάγραμμα δοκιμών
- Περιεχόμενο δοκιμών

12 November 2007

14

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές Χώρας

### Σκοπός δοκιμών

Επιτυχής συμμετοχή όλης της ελληνικής τραπεζικής κοινότητας και των συστημάτων συμψηφισμού σε συγκεκριμένα σενάρια δοκιμών από τεχνικής, λειτουργικής πλευράς αλλά και διαδικασιών

12 November 2007

15

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές Χώρας

### Προϋπόθεση:

Επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών  
λειτουργικότητας

12 November 2007

16




## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές Χώρας

#### Χρονοδιάγραμμα δοκιμών

5 εβδομάδες:

Από 18 Ιανουαρίου ως 20 Φεβρουαρίου 2008



12 November 2007

17

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές Χώρας

#### Περιεχόμενο δοκιμών

- Ανταλλαγή όλων των τύπων εντολών(MT202/103/204) μεταξύ των Π.Ι. και της ΤtE κατανεμημένων σε 3 ομάδες
- Προσομοίωση του σαββατοκύριακου μετάπτωσης από το T1 στο T2
- Δοκιμές για τη λειτουργικότητα των SSP Modules (PM,SF), των τοπικών διαδικασιών για το διακανονισμό των συστημάτων συμψηφισμού σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες.
- Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης μέλους ή συμψηφιστικού φορέα
- Επανάληψη αποτυχημένων δοκιμών

12 November 2007

18

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές Χώρας

Συνοπτική περιγραφή οργάνωσης δοκιμών

- ❑ 3 ομάδες Π.Ι. (άμεσα + έμμεσα)
- ❑ 3 ενότητες δοκιμών
  - ❑ Σ/Κ Μετάπτωσης
  - ❑ Ημέρες Ομαλής Λειτουργίας T2
  - ❑ Ημέρες Έκτακτης Ανάγκης Π.Ι. & Σ.Σ.
- ❑ Συνεργασία με την Κ.Τ./Π.Ι. Πολωνίας

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές Χώρας

**Σενάρια δοκιμών: Λεπτομερή σενάρια ανάλογα και με τα τοπικά χαρακτηριστικά έχουν δημοσιευθεί στο site:**

<http://www.bankofgreece.gr/ecb/target2/t2tris/>

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας

- Σκοπός δοκιμών
- Προϋπόθεση διεξαγωγής
- Χρονοδιάγραμμα δοκιμών
- Περιεχόμενο δοκιμών

12 November 2007

21

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

## Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας

### Σκοπός δοκιμών

Επιτυχής συμμετοχή των Π.Ι. όλων των χωρών του 3ου παράθυρου μετάπτωσης στο TARGET2 και συνεπώς όλης της ελληνικής τραπεζικής κοινότητας και των συστημάτων συμψηφισμού σε συγκεκριμένα σενάρια δοκιμών

12 November 2007

22

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2


**Προϋπόθεση:**  
**Επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών**  
**λειτουργικότητας**

12 November 2007

23

Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

**Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας**  
**Χρονοδιάγραμμα δοκιμών**  
**10 εβδομάδες:**  
**Από 22 Φεβρουαρίου ως 2 Μαΐου 2008**



12 November 2007

24

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές Εργάσιμης Ημέρας Περιεχόμενο δοκιμών

- ❑ Ανταλλαγή όλων των τύπων εντολών μεταξύ των Π.Ι. όλων των χωρών του 3ου παράθρου μετάπτωσης στο TARGET2 κατανεμημένων σε 3 ομάδες
- ❑ Προσομοίωση του σαββατοκύριακου μετάπτωσης από το T1 στο T2 (σε πραγματικούς χρόνους/σαββατοκύριακο)
- ❑ Δοκιμές για τη λειτουργικότητα των SSP Modules (PM,SF), των τοπικών διαδικασιών για το διακανονισμό των συστημάτων συμψηφισμού σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες
- ❑ Δοκιμές προσομοίωσης δυσλειτουργίας της SSP
- ❑ Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (μέλους, ΤτΕ, συμψηφιστικού φορέα, SSP)
- ❑ Επανάληψη αποτυχημένων δοκιμών

## Δοκιμές των άμεσων μελών στο TARGET2

### Δοκιμές T1/T2

- ❑ **9-14/11/2007**
- ❑ **6/12-11/12/2007**
- ❑ **18/1/2008 (σενάρια μετάπτωσης)**
- ❑ **22/2/2008 (σενάρια μετάπτωσης)**

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επικοινωνία με e-mail: [t2testing@bankofgreece.gr](mailto:t2testing@bankofgreece.gr)

12 November 2007

27
